



Cenová ponuka na podprahovú zákazku

Predmet zákazky:

Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter

Uchádzač:

CS, s.r.o., Coburgova 84, Trnava 917 02

za CS, s.r.o.

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
e.u. 2440132356/0200



Ing. Miroslav Marcian
konateľ spoločnosti

V Trnave, dňa 23.4.2013



Obsah ponuky

Krycí list ponuky

Výpis z obchodného registra

Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Potvrdenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

Čestné vyhlásenie uchádzača

Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky
Čestné vyhlásenie uchádzača, že poskytol vyjadrenie všetkých bánk

Zoznam stavebných prác

Referencie

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi riadiacich zamestnancov

Doklad o odbornej spôsobilosti – stavbyvedúci

Čestné prehlásenie

Životopis

Návrh zmluvy

Rozpočet

Harmonogram – vecný, časový a finančný

Zoznam pododávateľov

Čestné vyhlásenie uchádzača

Banková záruka

Náčrtok s popisom kotvenia lavíc do podkladovej vrstvy

Kópia ponuky

Ponuka na CD nosiči


CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK22578954
z.z. 2440
Ing. Miroslav Marcian
konateľ

V Trnave, dňa 23.4.2013


CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK22578954
z.z. 2440132356



ISO 9001
CERTIFIED
BUREAU VERITAS

CS, s.r.o. Coburgova 84, 917 02 Trnava
Tel: 033 / 29 33 290 Fax: 033 / 29 33 291
Email: cs@csit.sk





Vyplni uchádzač a predloži na začiatku svojej ponuky ako 2. list za obsah ponuky

NAZOV: CS, S.T.O.,

Adresa: Coburgova 84, Trnava 917 02

Statutar: Ing. Miroslav Marcian, konateľ
IČO 4414537

ICQ 44101937

DIC 2022578954

Telefón: 033/29 33 290

Fax: 033/29 33 291

e-mail: csft@csft.sk

đến 100 triệu đồng.

bankové spojenie:

Názov: "Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – amfiteáter".

Cena diela:

Komunikácie a spevnené plochy

Komunikácie a sprevádzanie plochy

Uprava stupnov amiteatra (hladisko + podium)

27 1/8, 78 eur

Vymena potrubného vedenia odpadového kanála

18 495,26 eur
17 173,98 eur**Mobilisat**

30 945,92 eur

Geodetické práce, výtýčková práce IS

500,00 €

Spolu bez DPH

146 909,73 eur
29 381,95 eur

Cena diela s DPH

176 291,68 eur

Termín realizácie

1. etapa

720: 22. tyzden

Ukoncienie: 28. tyzden

Vyzdnoh:

Via sutazne podnikady

Uchádzač zároveň prehlasuje,

Uchádzač zároveň prehlasuje,

- že porozumeľ týmto súťažným podkladom a že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži.
- že mapové podklady použije len pri spracovaní ponuky pre predmet zákazky a že tento podklad neposkytne tretím osobám.

Uchádzač súhlasí so zaslaniem kópie ponuky v PDF formáte na Úrad pre verejné obstarávanie do CRDVO v zmysle zákona č. 25/2006 z. z., v znení neskorších zmien a doplnkov.

Datum: 23.4.2013

pečiatka a podpis
štatutára, konateľa

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101987, IČ DPH: SK2022578954
E-mail: 2440192356/0200 (14)

zadávanie podporovej zázky

CS, S.R.O.

V zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

CONFIDENTIAL
C. J. 244013238

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA**

Okresného súdu Trnava

Zoznam výpisov č.: KO-6937

8013

Oddiel: Sro
Vlozka číslo: 21753/T

I. OBCHODNÉ MENO

CS, s.r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Coburgova 84
Názov obce: Trnava
PSČ: 917 02

III. IČO: 44 101 937

IV. DEN ZÁPISU: 10.04.2008

V. PRAVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. čistenie a zimná údržba komunikácií
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. inžinierska činnosť v stavebníctve
4. výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske služby
5. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
6. prípravné práce k realizácii stavieb
7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. geodetické a kartografické práce
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
11. prenájom nehnuteľných vecí
12. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
14. nákladná cesta doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojného vozidla
15. odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
16. nákladná cesta doprava

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEL

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Marcian

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Bučianska 1842/2

CS, s.r.o.

Názov obce: Trnava
PSČ: 917 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 10.04.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Konateľ kona v mene spoločnosti samostatne.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Marcian

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Bučianska 1842/2

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 01

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR
Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

6 639,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

6 639,000000 EUR

Trnava, 31.01.2013

Správnosť výpisu sa potvrdzuje


Za správnosť výpisu: Zuzana Nagyová

(podpis oprávnenej osoby)

Nagyová

Osvädčujem, že táto listina doslova súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným podpisom), skladajú sa z listov (hákov). Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky: na listine neboli - boli vykonané opravy nezôd s predloženom listinou. V Trnave dňa 27.4.2013

Suzana Komárová
pracovníčka
poverená notárom



(odtlačok úradnej pečiatky)



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):

CS, s.r.o.
Coburgova 84
917 02 Trnava

Predmet podnikania:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- inžinierska činnosť v stavebníctve,
- výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske služby,
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb,
- drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
- prípravné práce k realizácii stavieb,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- geodetické a kartografické práce,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooberchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- prenájom hmotných vecí,
- prenájom nehmuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- nakladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojného vozidla,
- odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,
- nakladná cestná doprava

Statutárny orgán:

Ing. Miroslav Marcian

Identifikačné číslo organizácie (IČO):

44101937

Registračné číslo v zozname podnikateľov:

2012/12-PO-B9042

Platnosť potvrdenia do:

17. 12. 2013

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov
pre Ing. Miroslava Marciana
vychádzajúcim z registra trestov
vychádzajúcim z registra trestov
814 23 Bratislava, dňa 06. 11. 2012, pod číslom MIO345119H1B

✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vychádzajúcim z registra trestov
vychádzajúcim z registra trestov
dňa 08. 11. 2012, pod číslom Kp 1284/2012

vychádzajúcim z registra trestov
vychádzajúcim z registra trestov
dňa 08. 11. 2012, pod číslom 7NcOR/19372/2012


✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vychádzajúcim z registra trestov
vychádzajúcim z registra trestov
dňa 31. 10. 2012, pod číslom 36712-566/2012-TT

vychádzajúcim z registra trestov
vychádzajúcim z registra trestov
dňa 29. 10. 2012, pod číslom P002121100222

vychádzajúcim z registra trestov
vychádzajúcim z registra trestov
dňa 30. 10. 2012, pod číslom PV12044465

✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestnej príslušnej daňového úradu
vychádzajúcim z registra trestov
vychádzajúcim z registra trestov
dňa 06. 11. 2012, pod číslom 9200301/5/3218680/2012


✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
vychádzajúcim z registra trestov
vychádzajúcim z registra trestov
dňa 08. 11. 2012, pod číslom AD-5817/2012



[Handwritten signature]

Ing. Oliver Petrus
riadiť odbor
elektronického verejného obstarávania,
informačných technológií, vestníka a zoznamov

Bratislava, 07. 12. 2012



Služba KONTROLA
pracovníčka
poverená n. i. 12011

V Tmave dňa

s predloženou listinou.

na listine náboji - boli vykonané opravy nezhod

doplnky:

(čistočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,

cim sa z listov (nákov). Ide o odpis úpiný

zeným originálom (osvedčeným podpisom), skladajú

Osvetčujem, že táto listina doslovné súhlasí s predlo

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012

15-4 2012



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Číslo potvrdenia: 846-ZU/2013
Bratislava, dňa 12. 04. 2013

Potvrdenie

o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“) vydáva potvrdenie, že

Uchádzač / záujemca

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): CS, s.r.o.

Coburgova 84, 917 02 Trnava

Statutárny orgán:

Ing. Miroslav Marcian

Identifikačné číslo organizácie (IČO):

44 101 937

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 149 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.



Ing. Anna Juráková, PhD.
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľa odboru vestníka a zoznamov

Anna Juráková



CS, s.r.o. Coburgova 84, 917 02 Trnava
Tel: 033 / 29 33 290 Fax: 033 / 29 33 291
Email: csu@csu.sk
ISO 9001
DIN EN ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification




ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHAŤAČA

CS, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava týmto vyhlasuje, že nemá právoplatne uložený zákaz vo verejnom obstarávaní a nie je osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárnego orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárnego orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola a.s.poločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárnego orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.



Ing. Miroslav Marcian
konateľ

podpis

v Trnave, dňa 23.4.2013

Váš list číslo/zo dňa

11.04.2013

Naše číslo

307/80200/2013

Vybaňuje/linka

Ing. Sylvia Antolíkova /033 7

Miesto/dátum

Tрнава/11.04.2013

Bankové potvrdenie

Obchodné meno:

CS, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Coburgova 84, 917 02 Trnava

IČO:

44 101 937

Dátum vzniku:

10.04.2008

Základné imanie:

6 639,- EUR

Predmet činnosti:

- uskuočňovanie stavieb a ich zmien
- inžinierska činnosť v stavebníctve
- výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske služby
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- prípravné práce k realizácii stavieb
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- geodetické a kartografické práce
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- prenájom hnuiteľných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom podnikania v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojného vozidla
- odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných inžinieroch
- nákladná cestná doprava

CS, s.r.o.

Coburgova 84

917 02 Trnava

Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: 534



E-mail: santoli

Tel.:

Firmné obchodné centrum Trnava

obchodný register: Okresný súd Bratislava I

Mly

I. Vedenie účtu

1. Sme v obchodnom vzťahu viac ako rok
2. Účet nebol prečerpávaný po dobu troch rokov

II. Hodnotenie bonity

1. Klient je známy ako spoľahlivý
2. Klient je schopný plniť si finančné záväzky

III. Finančná situácia

1. Finančná situácia je stabilizovaná

„Firemné obchodné centrum Trnava potvrdzuje, že CS, s.r.o. je solventný klient:

- bežný účet klienta nebol za predchádzajúce tri kalendárne roky 2010, 2011, 2012 a v súčasnosti nie je v nepovolenom debete
- bežný účet nebol a nie je predmetom exekúcie
- zmluvné podmienky poskytnutého úveru plní riadne a včas.

Potvrdenie má výlučne informatívny charakter. Obsah a za následky, ktoré by mohli vzniknúť z jeho použitia. Potvrdenie je platné 3 mesiace od jeho vystavenia.

80260/03
80260/03

Ing. Peter Šarmír

Manažér klientenských vzťahov senior

Ing. Andrea Blaškova

Manažér klientenských vzťahov

Osvädčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným podpisom), skladajú sa z listov (háčkov). Ide o odpis úplný (čiasťochy). Na listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky: na listine neboli - boli vykonané opravy nezhod s predloženým listinou. V Trnave dňa 15.4.2011

Slavka Komárová
právnická
poverená notárom

Firemné obchodné centrum Trnava

Tel.: 032
E-mail: sa

obchodný register: Okresný súd Bratislava I

od




ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHADZAČA

CS, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava týmto vyhlasuje, že

ma vedený účet v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK202257854
z.ú. 2440132356/0200



Ing. Miroslav Marcian
konateľ

podpis

v Trnave, dňa 23.4.2013

CS, s.r.o.
a 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK202257854
z.ú. 2440132356/0200



789 578954

Obchodný register Obchodného registra v Trnave, Trnava, Slovensko

Zoznam stavebných prác

Názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta jeho podnikania:
Obec Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka
Stručný opis predmetu plnenia zmluvy: Areal voľného času – II. Etapa v obci Nová Dedinka
SO 08 Zjazdový chodník
SO 09 Chodníky a spevnené plochy
SO 010 -1 Oplotenie pri detskom ihrisku
SO 011 Návrh sadovnickej úpravy
Mobilár
Čas plnenia zmluvy (od-do, mesiac, rok): apríl 2009 – august 2009
Zmluvná cena v SKK bez DPH: 7 502 170,8,- SK bez DPH
Zmluvná cena v EURO bez DPH: 249 026,45,- EUR
Kontaktná osoba: Viola Takáčová – starostka obce, t.č.: 02/459 14 233

Názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta jeho podnikania:
Obec Dolný
Stručný opis predmetu plnenia zmluvy: Úprava verejných priestranstiev v obci Dolný
Objekty: Chodníky, Zastávka, Sadové úpravy, Mobilár
Čas plnenia zmluvy (od-do, mesiac, rok): august 2010 – december 2010
Zmluvná cena v EURO bez DPH: 347 777,01,- EUR
Kontaktná osoba: Ladislav Schmidt - starosta, t.č.: 033/6499113

Názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta jeho podnikania:
TSS GRADE, a.s., Bratislavská 4, 917 02 Trnava
Stručný opis predmetu plnenia zmluvy: Revitalizácia centra obce Cífer
SO 01.1 Úprava verejnej zelene – rekonštrukcia
SO 01.2 Verejné priestranstvá a spevnené plochy – rekonštrukcia
SO 01.3 Modernizácia prvkov drobnej architektúry rekonštrukcia
SO 02 Chodník ul. SNP – výstavba a rekonštrukcia
SO 03 Autobusové zastávky – rekonštrukcia
SO 04 Verejné osvetlenie výstavba
Čas plnenia zmluvy (od-do, mesiac, rok): jún 2011 – november 2011
Zmluvná cena v EURO bez DPH: 454 113,84 EUR
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Hačko - predseda predstavenstva, t.č.: 033/5511595

Názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta jeho podnikania:
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
Stručný opis predmetu plnenia zmluvy: Humanizácia OS Linčianska – Detské ihrisko MŠ Limbova, Trnava
Spevnené plochy, zemné a buracie práce, Hracie prvky a mobilár, Sadové úpravy
Čas plnenia zmluvy (od-do, mesiac, rok): august 2011 – september 2011
Zmluvná cena v EURO bez DPH: 63151,32 EUR
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Béreš – vedúci odboru investičnej výstavby, t.č.: 033/3236400

Názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta jeho podnikania:
Mesto Leopoldov
Stručný opis predmetu plnenia zmluvy: Priestorové a funkčné usporiadanie južného Námestia sv. Ignáca
Spevnené plochy, zemné a buracie práce, Hracie prvky a mobilár, Sadové úpravy
Čas plnenia zmluvy (od-do, mesiac, rok): máj 2011 – august 2011
Zmluvná cena v EURO bez DPH: 172 677,89 EUR
Kontaktná osoba: JUDr. Milán Gavorník - primátor, t.č.: 033/7342207

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
Ing. Miroslav Maršálek
konateľ

V Trnave, dňa 23.4.2013



podpis

Obchodná firma: CS, s.r.o. Trnava, Kollárova 917/02
SK2022578954

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
t.č.: 2440132356/0200

()

()

Názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta jeho podnikania: Obec Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka	
Stručný opis predmetu plnenia zmluvy: Areál voľného času – II. Etapa v obci Nová Dedinka	
Čas plnenia zmluvy (od - do, mesiac, rok): apríl 2009 – august 2009	
Miesto plnenia zmluvy: Nová Dedinka	
Zmluvná cena za dielo v slovenských korunách bez DPH: 7 502 170,80,- SK bez DPH	
Udať na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa) potrebné na overenie si uvedených informácií, podpis, pečiatka: Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác	
  Viola Takáčová – starostka obce, I. č.: 02/459 14 233	



Eva Benedikovičová
pracovníčka
poverená notárom

Osvädčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predlo-
ženým originálom (osvedčeným podpisom), skladajú -
cim sa z listov (listov). Ide o odpis úplný
(čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplnky:
na listine neboli - boli vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou. 4-3-2013
V Trnave dňa

REFERENČNÝ LIST

1. Názov a obchodné meno zhotoviteľa: CS, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava

2. Názov a obchodné meno objednávateľa: Obec Doľany

2. Adresa a sídlo objednávateľa: Obec Doľany, Obecný úrad, 900 88 Doľany

3. Názov stavby: Úprava verejných priestranstiev v obci Doľany

4. Stručný opis predmetu zmluvy:
Chodníky, Zastávka, Sadové úpravy, Mobilár

6. Zmluvná cena za predmet zmluvy v EURO bez DPH: 347 777,01EUR

7. Začiatok poskytnutia prác: august 2010

8. Konec poskytnutia prác: december 2010

9. Kontaktná osoba objednávateľa: - meno a priezvisko: Ladislav Schmidt - starosta

- funkcia: starosta
- číslo telefónu: 033/6499113

9. Prípadné vyjadrenie objednávateľa:

Dolupodpísaný zástupca objednávateľa – potvrdzujem, že objednané práce boli zhotovené v zmysle PD a ZoD.

V Doľanoch, dňa

OBEC DOĽANY

900 88 DOĽANY

okres Pezinok

Peciatka a podpis

Zodpovednej osoby objednávateľa

Eva Benedikovičová
právnice
poverená notárom

Osvädčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predlo-
ženým originálom (osvedčeným podpisom), skladajú-
ci sa z listov (náčkov). Ide o odpis úplný
(čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplňky:
na listine neboli - boli vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou.
7.3.2013
v Trnave dňa



REFERENČNÝ LIST

1. **Názov a obchodné meno zhotoviteľa:** CS, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava
2. **Názov a obchodné meno objednávateľa:** TSS GRADE, a.s.
2. **Adresa a sídlo objednávateľa:** Bratislavská 4, 917 02 Trnava
3. **Názov stavby:** Revitalizácia centra obce Cífer

4. Stručný opis predmetu zmluvy:

- SO 01.1 Úprava verejnej zelene – rekonštrukcia
- SO 01.2 Verejné priestranstvo a spevnené plochy – rekonštrukcia
- SO 01.3 Modernizácia prvkov drobnej architektúry rekonštrukcia
- SO 02 Chodník ul. SNP – výstavba a rekonštrukcia
- SO 03 Autobusové zastávky – rekonštrukcia
- SO 04 Verejné osvetlenie výstavba

6. **Zmluvná cena za predmet zmluvy v EURO bez DPH:** 454 113,84 EUR

7. **Začiatok poskytnutia prác:** jún 2011

8. **Koniec poskytnutia prác:** november 2011

9. **Kontaktná osoba objednávateľa:** - meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Hačko

- funkcia: predseda predstavenstva
- číslo telefónu: 033/5511595

9. **Prípadné vyjadrenie objednávateľa:**

Dolupodpisany zástupca objednávateľa – potvrdzujem, že objednané práce boli zhotovené a vykonané k mojej spokojnosti v zmysle PD a ZOD.

V Trnave, dňa

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937
Z.ú. 24401

Peciatka a podpis

Zodpovednej osoby objednávateľa

Slovak Republic
Ministry of Education, Youth and Sports
Slovakia

Osvetďujem, že táto listina doslovné súhlasí s predlo-
ženým originálom (osvedčeným podpisom), skladajú-
ci sa z listov (hákov). Ide o odpis úplný
(častočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplňky:
na listine neboli - boli vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou. 15. 4. 2013
V Trnave dňa

REFERENČNÝ LIST

1. **Názov a obchodné meno objednávateľa:** Mesto Trnava

2. **Adresa a sídlo objednávateľa:** Hlavná 1, 917 71 Trnava

3. **Stručný opis predmetu zmluvy:**

Humanizácia OS Linčianska – Detské ihrisko MŠ Limbova, Trnava

4. **Zmluvná cena za predmet zmluvy v EURO bez DPH:** 63 151,32 EUR

5. **Začiatok poskytnutia prác:** august 2011

6. **Koniec poskytnutia prác:** september 2011


7. **Kontaktná osoba objednávateľa:** - meno a priezvisko: Ing. Dušan Béres

- funkcia: vedúci odboru investičnej výstavby

- číslo telefónu: 033/3236400

8. **Prípadné vyjadrenie objednávateľa:**

V Trnave, dňa



Pečiatka a podpis


Zodpovednej osoby objednávateľa

Osvetcom, ze jemu opís pozostávajúci z listov,
doslova súhlasí s originalom (osvedčeným podpisom) listiny,
ktorá pozostáva z listov, ide o odpis úplný (často
V predloženej listine nie sú (sú) zmeny, doplnky, vsuvky
alebo škrt, ktoré by mohli osiahnuť jej hodnotnosť.
Na tomto odpise neboli (boli) vykonané opravy nezhod s
predloženou listinou.

V Hlohovci, dňa 23. 4. 2013

Vykonaním tohto úkonu notár neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvedených v listine.

Jana Chalupková
JANA CHALUPKOVÁ
zamestnanec poverený
notárkou JUDr. Miroslavou, PhD.
so sídlom v Hlohovci



REFERENČNÝ LIST

1. Názov a obchodné meno objednávateľa: Mesto Leopoldov

2. Adresa a sídlo objednávateľa: Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

3. Stručný opis predmetu zmluvy:

Priestorové a funkčné usporiadanie južnej strany Námestia sv. Ignáca

4. Zmluvná cena za predmet zmluvy v EURO bez DPH: 172 677,89 EUR

5. Začiatok poskytnutia prác: máj 2011


6. Koniec poskytnutia prác: august 2011

7. Kontaktná osoba objednávateľa: - meno a priezvisko: JUDr. Milan Gavorník - primátor


- číslo telefónu : 033/7342207

8. Prípadné vyjadrenie objednávateľa:

V Leopoldove, dňa



Zodpovednej osoby objednávateľa




Pečiatka a podpis


23.2.2011

Osvetčujem, že tento opis pozostáva z listov.
doslovné súhlasí s listom (osvedčeným odpisom) listu,
ktorá pozostáva z listov. Ide o odpis úplny (částečný),
V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vsuvky
alebo škrtý, ktoré by mohli oslabiť jej hodnotu.
Na tomto odpise neboli vykonané úpravy nezhod s
predloženou listinou.

V Hlohovci, dňa 29.4.2013

Vykonaťm tohto úkonu notár neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvedených v listine.


JANA CHALUPKOVÁ
zamestnanec poverený
notárkou JUDr. Ivou Hlohovou, PhD.
so sídlom v Hlohovci



**Údaje o vzdelaní a odbornej praxi riadiacich zamestnancov
a zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác, a ktorí sú
zodpovední za kontrolu kvality**

Meno a priezvisko:	Ing. Miroslav Marcian
Funkcia:	Generálny riaditeľ
Rok narodenia:	1979
Dosiahnuté vzdelanie:	VŠ
Osvetlenie:	STU MTF Trnava
Odborná prax:	Cesty Nitra a.s. 6/1997 – 5/2008 – majster geodet CS, s.r.o. 6/2008 – súčasnosť - konateľ
Meno a priezvisko:	Ing. Igor Badura
Funkcia:	Obchodný riaditeľ
Rok narodenia:	1968
Dosiahnuté vzdelanie:	VŠ
Osvetlenie:	STU SF Bratislava
Odborná prax:	Cesty Nitra a.s. 3/1993 – 12/2011 – stavebyvedúci, vedúci strediska CS, s.r.o. 7/2012 – súčasnosť - stavebyvedúci, obchodný riaditeľ
Meno a priezvisko:	Ing. Jura Halmo
Funkcia:	Stavebný inžinier - senior
Rok narodenia:	1980
Dosiahnuté vzdelanie:	VŠ
Osvetlenie:	STU SF Bratislava
Odborná prax:	Cesty Nitra a.s. 2005 – 2010 – stavebyvedúci CS, s.r.o. 2010 – súčasnosť - stavebyvedúci

Ing. Miroslav Marcian
konateľ

podpis

v Trnave, dňa 23.4.2013



ISO 9001
BUREAU VERITAS
certification

CS, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava
Tel: 033 / 29 33 290 Fax: 033 / 29 33 291
Email: csit@csit.sk



Slovenská komora stavebných inžinierov

o s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Juraľ Halmo

narodeny/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavebyvedúci

s odborným zameraním **Inžinierske stavby**

s evidenčným číslom **11149*20***



Oprávenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.


[Handwritten signature]

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Predseda SKSI


Dátum vydania

19. 12. 2008



Oviedujem, že táto listina doslovne súhlasí s predlo-
ženým originálom (osvedčeným podpisom), skladajú-
cim sa z listov (nákov). Ide o odpis úplný
(čiasťový). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplnky:
na listine neboli - boli vykonané opravy nezhôd
s predloženom listinou.
22.2.2013
v Trnave dňa

Eva Benedikovicova
právnicička
poverená notárom



Čestné prehlásenie

Dolu podpísaný Ing. Juraľ Halmo, č. oprávnenia SKSI 11149*20*, odborne spôsobilá osoba pre činnosť stavbyvedúceho, kategória inžinierske stavby týmto prehlasujem:

- že budem uchádzačovi k dispozícii počas realizácie diela vo funkcii stavbyvedúceho pre plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky

Ing. Juraľ Halmo

.....
podpis



v Trnave, dňa 23.4.2013

ZIVOTOPIS

Meno, priezvisko, titul: Juraj Halmo, Ing.

Osobné informácie: miesto a dátum narodenia.: Trnava,

Prax:

2004 - 2005 - Základná vojenská služba

2005 - 2010 - Cesty Nitra a.s.

prac. zar.: stavbyvedúci

2010-CS,s.r.o.

prac. zar.: stavbyvedúci

Vzdelanie:

r. 1994 - ukončenie 8. roč. na ZŠ v Trnave,

r. 1994 - 1998 - Stredná priemyselná škola stavebná v Trnave odbor


Geodézia

r. 1998 - 2004 - Slovenská technická univerzita stavebná fakulta

v Bratislave, odbor Zdravotné inžinierstvo

Prehľad kvalifikácie:

práca s PC v programoch: Word, Excel, Acces, internet, outlook
express, Power point, AutoCad vodičský preukaz: sk. A, B
jazyky: nemicky - mierne pokročilý odborná spôsobilosť -
stavbyvedúci - inžinierske stavby


CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: 9
z.z. 2140133356/0200
(14)



zadavanie podporov zakazky

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch zo dňa 2.4.2013, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3. Predmetom zmluvy je dodávka stavby:

„Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter“

Rekonštrukcia má za cieľ obnovu jestvujúceho prírodného amfiteátra a jeho najbližšieho okolia. V rámci rekonštrukcie budú riešené tieto stavebné objekty:

- Komunikácie a spevnené plochy
- Úprava stupňov amfiteátra (hladisko + pódium)
- Vymena potrubného vedenia odpadového kanála
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia
- Mobilár

Výstavba bude rozdelená do dvoch etáp, ktoré budú časovo oddelené:

V I. etape sa budú riešiť tieto stavebné objekty:

- Úprava stupňov amfiteátra (hladisko + pódium)
- Vymena potrubného vedenia odpadového kanála
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia
- Časť mobiláru – lavice

Úprava stupňov amfiteátra (hladisko a pódium)

Tvar jestvujúcich stupňov prírodného amfiteátra bude zachovaný. V súčasnosti je nástupná podlahová plocha jednotlivých stupňov s povrchom z asfaltu a oporné múrky stupňov sú obložené prírodným kameňom. Schodiská sú z kamenných kociek.

Popis prác realizácie:

- odstránenie asfaltu hr. cca 5 cm v celom rozsahu podlahovej plochy stupňov a pódia (celková poddorysná plocha stupňov je približne 430 m² a pódia 39 m²)
- odstránenie podkladových vrstiev pod asfaltom hrúbky cca 25 cm
- očistenie, spevnenie, prešparovanie a prípadné doplnenie kamenného obkladu oporných múrikov stupňov
- očistenie, spevnenie, prešparovanie a prípadné doplnenie schodiskových stupňov
- zhutnenie existujúceho podkladu pod podkladný betón, zhutnenie musí byť prevedené tak, aby nedošlo k narušeniu kamenného muriva jednotlivých stupňov
- realizácia novej skladby stupňov a pódia: 1,4 cm kamenný koberec, 12,5 cm podkladný betón B 20/25, ktorý bude potrebné dilatovať, 10 cm štrkové podložie
- kamenný koberec bude spočívať z rovnomerného nanašania špeciálnej zmesi kameniva a živice vo vrstve cca 1,4 cm, frakcia kameniva 4/8 mm (napr. kamenný koberec – Mercury štandard alebo ekvivalentný). Vrstva musí byť utlačaná a uhladená oceľovým hladidlom do finálnej podoby. Betónovú podkladovú vrstvu nie je potrebné penetrvať, špeciálna zmes kameniva a živice je samopenetráčna. V kamennom chodníku (koberci) je potrebné priznať dilatácie hliníkovými lištami.

- poznámka: V prípade realizácie kamenného koberca vlastnými kapacitami zhotoviteľa, požaduje verejný obstarávateľ konzultáciu, resp. zaškolenie pracovníkov zhotoviteľa odbornou firmou, ktorá sa zaoberá výhradne realizáciou takýchto spevnených povrchov!
- spádovanie jednotlivých stupňov bude riešené v smere od kamennej steny k nižšie uloženému stupňu a následne až do pásu zelene

zadávanie podprahovej zákazky

- nová plocha pôda bude spádaná do zelene
- okolo existujúcej plochy tanečného kola je potrebné v zeleni zrealizovať drenáž z PVC drenážneho potrubia DN 160 mm, v hĺbke cca 1,0 m, dĺžky 100m. Drenáž bude vyústená do vsakovacej jamy (2mx2mx2m), ktorá bude umiestnená v lesoparku v smere od fit dráhy. Drenážne potrubie bude obalené filtračnou geotextíliou, obsypané štrkom a späťne zasypané vykopanou zemínou so zahusťovaním a následne bude naložené, odvoz a uloženie všetkého vybudovaného a demontovaného materiálu a suite na certifikovanú skládku

Výmena potrubného vedenia odpadového kanála

V blízkosti prírodného amfiteátra sa nachádza podzemné potrubné vedenie, ktoré zabezpečuje hydraulické prepojenie siete existujúcich napájacích a odvodňovacích kanálov Trnavských rybníkov. Potrubné vedenie je v súčasnosti poškodené a pred vyústením do odvodňovacieho kanála zúšťujúceho do rieky Parná je preváňané. Súčasne potrubie je vyskladané z betónových rúr DN 600, dĺžka potrubia je cca 72 m.

Popis prác realizácie:

- v trase križovania potrubia s existujúcou komunikáciou – spevnenou plochou bude zrealizované zarezanie a vybudovanie liateho asfaltu a v celej trase odkop potrubia,
- staré potrubie sa v celej riešenej trase odstráni, vykopané potrubie sa odvezie na skládku pre možnosť následnej recykliácie,
- výkop pre nové potrubie bude vyčistený a bude zrealizované lôžko hrúbky 20 cm štrkopieskom frakcie do 63 mm so zhutnením,
- nové potrubie sa uloží v rovnakej trase ako staré potrubie,
- nové potrubie bude zo železobetónových rúr typu napr. TŽP 60/200, DN 600,
- následne bude prevedené obsyp potrubia, späťny zásyp potrubia vykopanou zemínou a zahusťovanie trasy z výsevom trávového osiva,
- na vtokovej časti potrubia sa vybuduje nové železobetónové vtokové čelo s drážkami pre osadenie hrubých hrabíc pre zachytávanie nečistôt,
- na vtokovej časti sa vybuduje železobetónové vtokové čelo
- návrh realizácie výmeny potrubného vedenia odpadového kanála je popísaný v projekte. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, úsek ochrany vôd vydal na uvedený stavebný objekt dňa 11.9.2000 (predĺžené dňa 26.7.2012) povolenie na uskutočnenie vodnej stavby,
- dokumentácia a povolenie OÚŽP tvoria prílohu týchto súťažných podmienok,
- zriadenie 2 kusov oceľového zábradlia výšky 1,1 m, dĺžky cca 5 m/1 kus, a to na mieste vtoku a výtoku,
- späťny zásyp potrubia a realizácia liateho asfaltu hrúbky 5 cm na štrkovom podklade hrúbky 10 cm.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia

Pôvodné osvetľovacie stĺžiare (4 ks pri tanečnom kole, 2 ks pri pôdiu, 6 ks nad amfiteátrom) vrátane päťk a pôvodných káblových rozvodov budú odstránené. Osadených bude 7 kusov nových osvetľovacích stĺžiarov. Rozvážadacia skriňa pre ozvučenie amfiteátra umiestnená v tesnej blízkosti pôvodného pôda bude doplnená o potrebné rozvážadlá a ističe. Na predmetnú rekonštrukciu verejného osvetlenia a ozvučenia je vypracovaná projektová dokumentácia, podľa ktorej sa bude rekonštruovať verejného osvetlenia a ozvučenia realizovať. **Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú súčasťou súťažných podkladov.** Vzhľadom na nutnosť rozdeliť výstavbu do dvoch etáp, je potrebné v stavebnom objekte – verejné osvetlenie a ozvučenie riešiť tieto zemné práce:

- rezať existujúceho asfaltu (komunikácia, spevnené plochy) v trase prívodných káblov, odvoz vybudovaných asfaltov na skládku
- nové káble budú uložené v rýhách šírky 35 cm a hĺbky 90 cm a to tak, že pieskové lôžko pod káblom bude hrúbky 10 cm, zásyp kábľa bude realizovaný z piesku v hrúbke 30 cm, zostávajúca časť bude na hrúbku 35 cm zasypaná vykopanou zemínou a zostávajúci 10 cm bude zo štrku frakcie 0-32 a 5 cm liateho asfaltu s posypom jednotlivé trasy kabeleže budú navrhnuté a vedené tak, aby sa nemuseli poškodiť existujúce schody amfiteátra a tie spevnené plochy, ktoré sa v dôsledku rekonštrukcie nebudú meniť

Mobilár

- z priestoru hradiska amfiteátra budú odstránené jestvujúce stoly a lavice a budú odvezené na skládku
- demontáž stolov a lavíc z priestoru pred bufetom bude vykonaná odbornou, bez porušenia príslušného zaradenia
- po zrekonštruovaní stupňov amfiteátra bude na tieto stupne osadená sedacia časť, ktorú verejný obstarávateľ požaduje z tvrdého plastového materiálu vyrábaného výlučne z odpadových zmesových plástov. Lavice budú pozostávať z troch dosiek z tvrdého plastu zelenej farby. Každá doska bude rozmerov: šírka 120 mm, hrúbka 40 mm a dĺžka bude prispôbena na zaoberanie jednotlivých stupňov amfiteátra (pred realizáciou je potrebné vypočítať kladacský plán dosiek a tento konzultovať alebo predložiť ku schváleniu zástupcovi objednávatela). Plástové profily (dosky) musia byť odolné voči teplu, mrazu, vlhku a pod. a musia byť farebne stále. Dosky budú uložené na priečnych podporách z tvrdého plastu hrúbky min. 30 mm (z dôvodu odvádzania dažďových vôd a jednoduchšej údržby a čistenia stupňov i pod samotnými lavicami) a pevne a odolne voči mechanickému poškodeniu.
- **Verejný obstarávateľ požaduje s cenovou ponukou predložiť aj vzorku dosky z tvrdého plastového materiálu zelenej farby a náčrtok s popisom kotvenia lavíc do podkladnej vrstvy!**

V II. etape sa budú riešiť tieto stavebné objekty:

- Komunikačné a spevnené plochy
- Časť mobiláru – smetné koše, stojany na bicykle

Komunikačné a spevnené plochy

Jestvujúca prístupová komunikácia je v súčasnosti s povrchom z asfaltu, na niektorých miestach prevláda alebo vyduťá koreňovým systémom stromov. Dažďové vody v súčasnosti otekajú na okraj chodníka a do okolitého terénu, kde sa vďaka nepriepustnému podložíu vytvárajú zamokrené plochy.

Popis prác realizácie:

- odstránenie pôvodnej vrstvy liateho asfaltu hr. cca 5 cm (cca 1 400 m²)
- odstránenie podkladných vrstiev pod pôvodným asfaltom hrúbky približne do 50 cm cca 1 330 m² - realizácia novej skladby komunikácie: 8 cm betónová dlažba na štrkovom lôžku 4 cm, 15 cm kamenivo spevnené cementom (KSC II), 20 cm podklad zo štrkodrvy frakcie 0-63, podkladové vrstvy požadujeme zhutniť
- parametre betónovej dlažby: rozmer 20/20/8 cm bez fázy – nehlučná, antracitovej farby, z nášľapnou vrstvou z kremečitého piesku, zvýšená odolnosť a odolnosť voči UV žiareniu, mrazuvzdornosť a odolnosť voči soľam. **Verejný obstarávateľ požaduje s cenovou ponukou predložiť aj vzorku betónovej dlažby!**
- vyspádovanie novozrealizovanej komunikácie bude v minimálnom spáde 1,5 % od mŕnika optenia vodného náhonu, resp. od budovy bufetu k novovytvoreným zámkom, ktoré budú zrealizované po obvede amfiteátra (na šírku cca 1,8 m = cca 70 m²) zo zámokových obrubníkov, ktoré budú osadené vo výške prístupnej komunikácie z betónovej dlažby. Obrubníky budú osadené tak, aby zrážkové vody boli plynule odvádzané z tejto komunikácie do plochy zámokov.
- v priestore zámokov bude existujúca konštrukčná vrstva odstránená do hrúbky cca 30 cm a následne vyplnená zemnou vhodnou na výsadbu rastlín
- okolo existujúcich vzrastlých stromov budú vytvorené zámky olemované zámokovými obrubníkmi. Tieto zámky budú upravené (korene stromov) a vyplnené zemnou.
- stýk medzi existujúcou komunikáciou a novorealizovanou komunikáciou z betónovej dlažby v smere od hlavnej cesty na Biely Kostol a od hotela Koliba bude riešený zariadením jestvujúcej asfaltovej komunikácie a budú tam osadené zapustené cestné obrubníky bez skosenia. Rovnaké obrubníky budú osadené aj pri ukončení spevnených plochy smerom k fit dráhe (nespevnená plocha)
- zabrány od komunikácie do Bieleného Kostola budú odbornou zdemontované a pri realizácii späťne osadené
- na certifikovanú skládku

zadávanie podpráhovej zákazky



- stojany na bicykle – dodávka a montáž 8 ks stojanov totožných ako sú už zabudované pri detskom ihrisku. Kovenie do betónových páteŕ. Umiestnenie stojanov bude upresnené v priebehu výstavby.

- smetné koše – budú použité zdemontované koše z pešej zóny – Hlavnej ulice v Trnave v počte 5 kusov, vybudovanie betónových základov (cca 0,5 x 0,5 x 0,15 m na štrkovom lôžku hrúbky 15 cm) pod koše a ich osadenie (upresnené v priebehu výstavby) je predmetom tejto súťaže.

Predmet zákazky zahŕňa náklady na dopravu, náklady na odvoz a uloženie vyburaných materiálov a iných materiálov na certifikovanej skládke vrátane poplatkov za ich uloženie. Súčasťou realizácie zákazky sú:

- vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí,

- geodetické práce.

Práce v zmysle požiadaviek objednávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie (časť), ktorá bola súčasťou súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať vyhlášku MZP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť za úhradu aj naviac práce – práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve, dodatčne požadované objednávaťom v rozsahu do 20% pôvodného cenového objemu, ak sa nedohodnú zmluvne strany inak. Toto zvýšenie rozsahu prác nebude mať dopad na zmenu termínu, ak sa zmluvne strany nedohodnú inak.

2.7. Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú:

a) výzva na predloženie ponuky

b) súťažné podklady zo dňa 2.4.2013

c) ostatné podklady uvedené v článku IV., bod 4.6.

Ch. III.

KVALITA PREDMETU DIELA

3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.

3.3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi: Súčasne s odovzdaním diela v zmluvnom termíne, odovzdá objednávateľovi doklady:

a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením,

b) predložením potvrdených realizovaných projektov so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní, resp. projekt skutočného vyhotovenia,

c) zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase

vykonanie týchto skúšok sú v cene diela,

- d) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaní skúšok použitých materiálov (napr. overacie kontrolné skúšky základných vrstiev, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, skúšky, protokoly o miere zhutnenia, a i.).
- e) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
- f) kópie zo stavebného denníka,
- g) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13. Zákona 254/98 Z. z. s potvrdením o vykonaní skúšok a kontrolách,
- h) doklady o preukázaní zhody, atest, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
- i) potvrdenie správcu skládok o prijatí stavebných odpadov vo faktúrovanom množstve,
- j) potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
- k) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
- l) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14. Zákona č. 254/98 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehľadov formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehľadov musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
- m) porovnávacie zameranie vo formáte dgn, (3x tlač, 1x CD nosič) vypracované odbornou spôsobilým geodetom
- n) geometrický plán v troch vyhotoveniach pre zápis do katastra nehnuteľností.

V opačnom prípade má dieľo vady.

Čl. IV. CENA DIELA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške: 176 291,68 eur (s DPH), slovom: stosedemdesiatšesťtisícdeväťdesiatjedna eur a 68 centov vrátane DPH

- 4.1.1. Cena diela :

Komunikácie a spevnené plochy	52 615,79 eur
Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium)	27 178,78 eur
Výmena potrubného vedenia odpadového kanála	18 495,26 eur
Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia	17 173,98 eur
Mobilár	30 945,92 eur
Geodetické práce, vytyčovanie práce IS	500,00 eur
Spolu bez DPH	146 909,73 eur
20 % DPH	29 381,95 eur
Cena diela s DPH	176 291,68 eur

- 4.2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.

- 4.3. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné ku prevzatí a kolaudácii stavby a jej odovzdaniu do užívania.

- 4.4. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:

- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
 - normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre stavbu povolenie, v súťažných podmienkach, v súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - zhotovenie podrobnejšieho realizačného projektu, obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov (štrkov, zemín, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
 - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
 - náklady na zriadenie staveniska, osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - poistenie diela,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriznanom počasí, náklady vyplývajúce z plánu organizácie výstavby
 - náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady pre zabezpečenie vjazdu do prevádzok susediacich s komunikáciou
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a na priliehajúcich mestských komunikáciách
 - náklady na dočasné optietenie stavby
 - náklady na dočasné dopravné značenie.

4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípade:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia projektu stavby, súťažných podmienok, súťažných podkladov
- c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
- d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu,

4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:

- súťažné podklady zo dňa 2.4.2013,
- výzva na predloženie ponuky,
- etapizácia výstavby,
- projektová dokumentácia – odpadový kanál,
- projektová dokumentácia – verejné osvetlenie,
- mapový podklad (výrez z technickej mapy mesta),
- výkaz výmer (časť verejné osvetlenie),
- fotodokumentácia amfiteátru, fotodokumentácia sondy,
- fotodokumentácia požadovaných materiálov,
- mapový podklad.

4.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo doplniť predmet diela o ďalšie práce a dodávky a to i bez súhlasu zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto práce a dodávky za úhradu zabezpečiť, ak takto požadované práce svojim finančným objemom neprekročia 20% z dohodnutej ceny za dielo, bez dosahu na termín plnenia.

4.8. Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác prípadne zámenu materiálov oproti súťažným podkladom v rozsahu max. 20% z ceny diela ak sa nedohodne s dodávateľom stavby inak.

zadávanie podprahovej zákazky

CS, s.r.o.

Coburgova 84, 917 02/119
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022572654
V zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákona č. 363/2009

14

()

Q

4.10. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenný materiál a zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny prístup. Požadavky na zámenný materiál musia byť vykonané písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na pripadnú úhradu preukázateľných nákladov, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálu, príp. 1 mesiac pred ich zabudovaním (záväzná objednávacia doba). Všetky skutočnosti musia odsúhlasiť osoby, uvedené v čl. I., bod 1 b).

4.11. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác a ich charakteru. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenný materiál, výrobkov či zariadení za objednávateľa môžu potvrdiť jedine osoby uvedené v čl. I., bod 1 b) tejto zmluvy a to písomne zápisom do SD.

4.12. V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukciám alebo rozšíreniu predmetu diela na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak tak nie je možné oceniť naviac práce z dôvodu neobstarania príslušnej jednotkovej ceny v prílohe č. 1, je možné ak sa zmluvné strany nedohodnú inak spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 4.13 s tým, že výšku jednotkovej ceny takto vykaikulovanej písomne odsúhlasí objednávateľ uvedený v čl. I., bod 1 b). Zmluvné strany dohodnú dodatok k zmluve do 15 dní po dohodnutí novej ceny diela.

4.13. Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 4.12.

a) zhotoviteľ vykaikuluje cenu s uplatnením normatívov spotreby v SPON 1997 a normatívov zhotoviteľa, uplatnenie normatívov zhotoviteľa musí byť vopred odsúhlasené objednávateľom uvedený v čl. I., bod 1 b),

b) ceny materiálov uplatní podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň obstarania,

c) ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) uplatní podľa cien uvedených v špecifikácii (príloha č. 1) resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov.

4.14. Keď sa poskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné:

- keď nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zisťovacom protokole tak platí jednotková cena, uvedená v ponukovej cene.

4.15. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce naviac, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa uvedeného v čl. I., bod 1 c), zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom uvedeného v čl. I., bod 1 b). Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok naviac, ku ktorému sa vyjadri technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ocenenie prác naviac je potrebné previesť podľa bodu 4.12. resp. 4.13.

Čl. V. ČAS PLNENIA

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dvoch časovo oddelených etapách a to:

I. etapa: od 18.12.2006 do 31.12.2006

II. etapa: od 31.12.2006 do 31.12.2006

5.2. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v súlade s časovým a vecným harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

5.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akékoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku na omeškanie s plnením etapy harmonogramu alebo predĺžením času plnenia podľa bodu 5.1.

5.4. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp

zadávanie podprahovej zákazky



harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane o 15 kalendárnych dní alebo nedodržia harmonogram výstavby a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.3., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinností za podstatné porušenie zmluvy.

5.5. Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k preneseniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I, bod 1 b).

5.6. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 5.1. má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie v zmysle článku IX. a odstúpi od zmluvy.

Čl. VI. PLATBNÉ PODMIENKY

6.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadri do päť pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác technickým dozorom investora má právo zhotoviteľ vystaviť čiastkovú – mesačnú faktúru, ktorá bude mať náležitosť daňového dokladu.

6.2. Zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú faktúru, ktorá bude mať náležitosť daňového dokladu po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez väd a nedorobkov.

6.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutých ceny diela na základe zhotoviteľom správne, formálne a vecne vystavených faktúr a to do 14 dní od ich doručenia objednávateľovi.

6.4. Ak faktúry nebudú obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ich do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Opraveným vrátením faktúr prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravených faktúr objednávateľovi.

6.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odučtovať v konečnej faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto ZO.

6.6. Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra budú obsahovať tieto údaje:

- označenie diela,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa čl. 6.1,
- ustanovenie zmluvy, ktoré opravňuje fakturovať,
- deň zdaniteľného plnenia,
- deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma,
- rozpis už fakturovaných čiastok,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- prílohou k faktúram bude potvrdený súpis vykonaných prác technickým dozorom investora (objedávateľa)



7.1. Odovzdanie staveniska

- 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko ako celok s právoplatným stavebným povolením, resp. zmenou stavby pred jej dokončením a platným povolením na uskutočnenie vodnej stavby najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy o diele.
- Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

- 7.1.2. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odber realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií (vrátane podružného merania).
- 7.1.3. Bezodvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4. Tieto skutočnosti budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je povinný zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

- 7.1.5. Ak prácami budú dotknuté inžinierske siete alebo v prípade činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné riadiť sa vyjadreniami dotknutých správcov sietí, ktoré obdĺži zhotoviteľ od objednávateľa v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
- 7.1.6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytyčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a položiť jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytyčenie a správne zameranie výškových kôt, je povinný sa o prevzate body starať až do odovzdania diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraviť na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov a ostatných účastníkov stavebného konania a vodoprávného konania, potrebné na zhotovenie diela.
- 7.2.2. Je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.3. Objednávateľ uvedený v čl. I, bod 1 a), b) a c) je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.4. Je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác stavby i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.
- 7.2.5. Záznam z kontrolných a pracovných porád za účasti poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa, je objednávateľ povinný vypracovať prostredníctvom technického dozoru investora.

zadávanie podprahovej zákazky

7.3. Povinnosti zhotoviteľa

- 7.3.1. Je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (bezpečnostný zástupca) - *Ing. J. Malina*, č. oprávnenia *112497/2017* stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a v zákone č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávatelia denne. Zároveň je povinný viesť v SD podrobný popis vykonaných prác.
- 7.3.2. Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávatelom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

- 7.3.3. Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vyplnený stavebný denník v zmysle pokynov na vedenie stavebného denníka vydaných MVA SR a zväzom podnikateľov Slovenska, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.
- 7.3.5. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností, alebo častí diela, je povinný vyzvať objednávatela na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku a to aspoň 1 deň vopred. Z dôvodu operatívnej zmluvy v zápisoch oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác.

- 7.3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 O. Z. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávatelom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť ani pri vynaložení odborných spôsobilostí a využití svojich vedomostí.

- 7.3.7. Má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s preušetrením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.

- 7.3.8. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela.

- 7.3.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu pre stavbu používanú komunikácie a prístupných komunikácií, zároveň zabezpečí osvetlenie staveniska počas výstavby.

- 7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannéj zóny staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí staveniska.

- 7.3.11. Zabezpečiť vo svojej režií pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonávanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby obznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a ich dodržiavania počas výstavby.

- 7.3.12. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie naviac prác spada do postupu, definovaného v bode 4.12. a 4.13.

zadávanie podprahovej zákazky

7.3.13. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.

7.3.14. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecne technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviteľ stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.

7.3.15. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v nálezitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov (ak sa vyskytnú).

7.3.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.

7.3.17. Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.16 tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky z toho vyplývajúce.

7.3.18. Prípadnú zmenu poddodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa, čl. I., bod 1 b). Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávať zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.

7.3.19. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán na dobu realizácie stavby a tento priebežne dopĺňať. Rovnako je povinný vypracovať plán užívania verejnej práce.

7.3.20. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zemných prác vytýčiť osi inžinierskych sietí ich správcami a niešť zodpovednosť za ich funkčnosť počas doby výstavby.

7.3.21. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerne zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). Pre zabezpečenie nevyhnutných bezpečných prechodov (realizácia lávok, násypov, dopravné značenie a i.) na verejnom priestranstve a stavenisku je povinný tieto zrealizovať, nakoľko nie je možné vylúčiť účasť tretích osôb. Ďalej je povinný zabezpečiť bezpečné vstupy do existujúcich nehnuteľností /prípadne premostenie s obojsmerným zábradlím, signálna páska a pod./.

7.3.22. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobštarat vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006.

7.3.23. Zhotoviteľ je povinný zvoľávať minimálne 1 x za 14 dní kontrolné porady.

7.3.24. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas výstavby prejazd a prístup vozidiel s prednostným právom.

Čl. VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

zadávanie podprahovej zákazky



8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady v zmysle článku III., bod 3.3.
V opačnom prípade má dielo vady.

8.3.	Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dieťa odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela tak, aby bolo možné dieťa riadne prevziať a užívať.
8.4.	Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dieťa má vady, dieťa neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobе a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dieťa po odstránení týchto väd.
8.5.	Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

8.5. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

9.1	Ak sa v priebehu realizácie diela objaví navyšiac práce a činnosti, ktoré neboli zahrnuté do ceny diela dohodnutej na základe položkovitého rozpočtu, je objednávateľ oprávnený požiadať zhotoviteľa v priebehu výstavby diela o zmenu diela. Každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti dohodnutej cene diela bude zapísaná v stavebnom denníku a osobitne potvrdená oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
9.2	Ak objednávateľ požaduje zmenu diela zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

9.2.1 Objednávatel vystaví požiadavku na zmenu diela a zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

9.2.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní od dňa doručenia požiadavky na zmenu diela respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny diela, vykoná ocenenie zmeny diela požadovanej objednávateľom. Pri ocenení zmeny diela postupuje zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny v súlade s bodom 4.12 a 4.13,
- c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané, znížené o 20%,
- d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.

9.2.3 Objedávateľ v lehote do 5 dní od dňa doručenia ocenia zmenu diela resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny diela, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny diela alebo zmenu zamietne.

9.2.4 V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny diela, objednávateľ vystaví príkaz ku zmene diela a doručí ho zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný takto odsúhlasený príkaz ku zmene diela prevziať a realizovať zmeny obsiahnuté v príkaze ku zmene diela v dohodnutom termíne.

9.3 Prikaz ku zmene sa považuje za dodatok k položkovému rozpočtu, pokiaľ bol potvrdený objednávatelom a zhotoviteľom v súlade s vyššie uvedeným postupom.

zadávanie podprahovej zákazky

V zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnóm obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o verejnóm obstarávaní).



CS, S.T.O.

Zmluvné strany sa zaväzujú pribežne počas zhotovovania diela na základe výzvy ktoréhokoľvek zo zmluvných strán uzatvoriť dodatok k zmluve o dielo, ktorý bude zohľadňovať zmeny diela vykonané na základe príkazov ku zmene vyhotovených za predchádzajúcim kalendárny mesiac. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe príkazov ku zmene, za podmienok uvedených v článku VI zmluvy o dielo a uzatvorenia príslušného dodatku k zmluve o dielo a objednávatel je potom povinný takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

9.4 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných objednávatelom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené prísť ku zmene termínu výstavby.

9.5 V prípade, že zmenu diela bude požadovať zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa odseku 2 a následne tohto článku zmluvy. Navyše práce požadované zo strany zhotoviteľa môžu byť realizované len s písomným súhlasom objednávatela.

Čl. X. SANKCIE

10.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:
a) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a v termíne podľa bodu 5.1 tejto zmluvy,
b) 400,- eur za každý aj začatý deň omeškania, ak nevypratá stavenisko v lehote dohodnutej v bode 5.1. tejto zmluvy.

10.2 V prípade omeškania objednávatela s úhradou čiastkových / mesačných / platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2 Dielo má vady ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zatážené inými právmi tretích osôb.

11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávatela a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávatela, ale ten na ich použitie písomne trval.

11.4 Za skryté vady, ktoré objednávatel nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávatelovi (Obchodný zákonník § 562, ods.2, písm. c).

11.5 Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

zadávanie podprahovej zákazky

V zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene, a doplnení zákona č. 363/2015 Z. z. o zadávaní podprahovej zákazky

14

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101987, IČ DPH: SK2022576534



MESTO TRNAVA

11.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

11.7. V prípade zabezpečenia subdodávok zhotoviteľom, začína záručná lehota plynúť dňom odovzdania stavebného diela objednávateľovi.

11.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.

11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.8. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.

11.10. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny, zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

Čl. XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. XIII.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

13.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

13.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou max. ceny podľa bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.

13.3. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIV. DALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

zadávanie podprahovej zákazky

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Čl. XV.

15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.

15.2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

15.3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

15.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 15.1.

15.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.

15.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

15.7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa.
b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosť daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.
c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

16.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

16.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy

a) príloha č. 1 - ponukový rozpočet stavby s výkazom výmer
b) príloha č. 2 - presný časový a vecný harmonogram /v týždňoch/ a finančný harmonogram platieb /v mesiacoch/
c) príloha č. 3 - súpis pododávateľov s percentuálnym vyjadrením podielu subdodávok /ak sa vyskytnú/

16.5. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

zadávanie podprahovej zákazky

V zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene, a doplnení zákona NR SR č. 441/2004 Z.z. o podprahovej zákazke
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022576534
14

CS, s.r.o.
917 02 Trnava



16.6. Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z toho päť je určených pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

16.8. Zmluva bola zverejnená dňa2013.

V Trnave, dňa2013

V dňa2013

Ing. Vladimír Butko
primátor

objednávateľ

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
zhotoviteľ

Ing. Miroslav Marcin
konateľ

zadávanie podprahovej zákazky

V zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene

SÜHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteá

Miesto: Trnava

Dátum: 23.04.2013

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov 146 409,73
Ostatné náklady zo súhrnného listu 500,00

Cena bez DPH 146 909,73

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižena	20,00%	z	146 409,73
			29 281,95

Cena s DPH 176 191,68

Objednávateľ	Dátum a podpis:	Peciatka
Projektant	Dátum a podpis:	Peciatka
Spracovateľ	Dátum a podpis:	Peciatka
Zhotoviteľ	Dátum a podpis:	Peciatka

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO:44101937, IČ DPH:SK20225/85J4
č.ú. 2440152356/0200

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfite

Miesto: Trnava

Dátum: 23.04.2013

Projektant:

Spracovateľ:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

01	Komunikácie a spevnené plochy	52 615,79	63 138,95
02	Úprava stupňov amfiteátra (hladisko +	27 178,78	32 614,54
03	dórium) Výmena potrubného vedenia odpadového	18 495,26	22 194,31
04	kanála Verejné osvetlenie a ozvučenie	17 173,98	20 608,78
05	Mobilár	30 945,92	37 135,10
		146 409,73	175 691,68

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

		500,00	600,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	146 909,73	176 291,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter

Stavba:
Objekt:

01 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto: Trnava Dátum: 23.04.2013

Objednávatel':

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	52 615,79
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	52 615,79

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižena	20,00%	z	52 615,79
Cena s DPH	V	EUR	63 138,95

Projektant	Dátum a podpis:	Peciatka
Spracovateľ	Dátum a podpis:	Peciatka

Objednávatel'	Dátum a podpis:	Peciatka
---------------	-----------------	----------

Zhotoviteľ	Dátum a podpis:	Peciatka
------------	-----------------	----------

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO:44101937, IČ DPH:SK2022576534
č.u. 2440152356/0200

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
 Objekt: 01 - komunikácie a spevnené plochy

Miesto: Trnava Dátum: 23.04.2013

Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	
HSV - Práce a dodávky HSV	51 920,16
1 - Zemné práce	11 451,34
5 - Komunikácie	39 394,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 074,22
M - Práce a dodávky M	695,63
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	240,40
99 - Presun hmôt HSV	455,23
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 615,79

ROZPOČET

Stavba: Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
Objekt: 01 - komunikácie a spevnené plochy

Miesto: Trnava Datum: 23.04.2013

Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ:

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 51 920,16
1 - Zemné práce 11 451,34

9	K	113307132	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. Vrstvy do 150 mm - 0,225t	m ²	1 330,000	3,60	4 788,00
17	K	113307222	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kamienka hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	1 330,000	1,08	1 436,40
16	K	113307241	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	1 330,000	0,72	957,60
21	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	109,670	2,92	320,24
22	K	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovline do 1:5	m ²	548,320	0,62	339,96
23	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	22,800	4,40	100,32
24	K	181301103	Rozprestenie ornice v rovline , plocha do 500 m ² ,hr.do 200 mm	m ²	548,320	1,20	657,98
27	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovline alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m ³	ks	826,000	0,11	90,86
28	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	826,000	0,09	74,34
13	K	183901144	Doplnenie zeminy do záhonov	m ³	24,500	2,59	63,46
29	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovline alebo na svahu do 1:5	m ²	118,000	0,81	95,58
30	M	pol 2	Trvalky	ks	826,000	1,20	991,20
19	K	979093111	Poplatok za skládku	t	120,000	0,33	39,60
18	K	979091211	Doprava vyburaných hmôt vodorovne premiestnenie sutiny na vzdialenosť do 7000 m	t	390,000	2,10	819,00
15	K	pol1	Poplatok za skládku	t	120,000	5,64	676,80

5 - komunikácie

6	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m ²	1 330,000	4,90	6 517,00
5	K	567123821	Podklad z kamienka spevneného cementom na diaľnici s rozprestením a zhutnením KZC II, hr.150 mm	m ²	1 330,000	8,30	11 039,00
4	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m ²	1 330,000	1,02	1 356,60
2	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m ²	m ²	1 330,000	8,10	10 773,00
3	M	5922902060	SEMAELROCK CITYTOP dlažba bez fazy 8 cm, čierna (20/20)	m ²	1 330,000	7,30	9 709,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek	t	1 517,425	0,30	455,23
----	---	-----------	---	---	-----------	------	--------

99 - Presun hmôt HSV 455,23

26	K	360020681	Zámočnické práce - Demontáž a montáž zábran	kom	1,000	240,40	240,40
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 240,40

M - Práce a dodávky M 695,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	160,630	4,61	740,50
8	M	5921745000	Obrubník zdhonový 100x20x5, sivý	ks	162,236	1,26	204,42
20	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	30,000	4,31	129,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
Objekt: 02 - Úprava stupňov amfiteátra (hladisko + pódium)

Miesto: Trnava
Dátum: 23.04.2013

Objednávateľ: IČO: IČO DPH:
Zhotoviteľ: IČO: IČO DPH:
Projektant: IČO: IČO DPH:
Spracovateľ: IČO: IČO DPH:

Náklady z rozpočtu		27 178,78	0,00
Ostatné náklady		27 178,78	0,00
Cena bez DPH		27 178,78	
DPH základná	20,00%	z	0,00
	20,00%	z	27 178,78
znižena			5 435,76
Cena s DPH		V	32 614,54
		EUR	

Projektant	Dátum a podpis:	Peciatka
Objednávateľ	Dátum a podpis:	Peciatka
Spracovateľ	Dátum a podpis:	Peciatka
Zhotoviteľ	Dátum a podpis:	Peciatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Trnava20130415 - Revitalizácia areálu kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
02 - Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium)

Datum: 23.04.2013

Projektant:
 Spracovateľ:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

Trnava

Miesto:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodovodné konštrukcie

99 - Presun hmôt HSV

589,03
 20 857,50
 1 285,22
 4 447,03

27 178,78

27 178,78

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 178,78

CS, s.r.o.
 Gébúrgova 84, 917 02 Trnava
 IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022576534
 E-mail: 2140102356/0200

ROZPOČET

Stavba: Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
Objekt: 02 - Úprava stupňov amfiteátra (hľadisko + pódium)

Miesto: Trnava Datum: 23.04.2013

Objednávateľ: Projektant: Spracovateľ:

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	113107241	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	469,000	0,72	337,68
2	K	113307232	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. Vrstvy do 150 mm - 0,225t	m2	469,000	3,60	1 688,40
33	K	171201202	Poplatok za skládku	t	180,000	0,33	59,40
31	K	979091111	Vodorovné premiestnenie vybraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m	t	280,462	3,15	883,46
11	K	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3, pre trativod	m3	60,000	4,51	270,60
30	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	469,000	0,41	192,29
29	K	pol4	Poplatok za skládku	t	180,000	5,64	1 015,20

4 447,03

27 178,78

27 178,78

2 - Zakladanie

14	K	211971121	Zhuťov. opášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opášť. od 0 do 2, 5 m	m2	110,000	1,11	122,10
15	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax pp 300	m2	110,000	1,00	110,00
13	K	212572111	Ložko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	6,000	19,50	117,00
12	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	100,000	5,20	520,00
16	M	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	101,000	4,12	416,12

1 285,22

4 - Vodorovné konštrukcie

8	K	451311621	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodosťavebného V4-C 20/25 hr.12,5 cm	m2	450,000	16,62	7 479,00
7	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuťnením, hr.po zhuťnení 100 mm	m2	450,000	1,26	567,00
5	K	pol1	Očistenie, spevnenie, prešpáľovanie a prípadné doplnenie kamenného obkladu oporných múrikov stupňov	kom	1,000	3 700,00	3 700,00
6	K	pol2	Očistenie, spevnenie, prešpáľovanie a prípadné doplnenie schodiskových stupňov	kom	1,000	800,00	800,00
9	K	pol3	Zhotovenie kamenného koberca	m2	450,000	8,20	3 690,00
10	M	pol4	Kamenný koberec - Mercury štandard, hr. 1,4 cm, frakcia kamienka 4/8 mm	m2	450,000	10,27	4 621,50

20 857,50

99 - Presun hmôt HSV

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998223011	Presun hmot pre pozemné komunikácie s krytom diaždovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	276,539	2,13
						589,03

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101987, IČ DPH: SK2022578534
S.Ú. 2440132358/0700
(14)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kameňný mlyn, II. etapa - amfiteáter
 03 - Výmena potrubného vedenia odpadového kanála

Dátum: 23.04.2013

Miesto: Objednávateľ:

IČO: IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: IČO DPH:

Projektant:

IČO: IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO: IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
 Ostatné náklady

18 495,26
 0,00

Cena bez DPH

18 495,26

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižena <td>20,00% <td>z <td>18 495,26</td> </td></td>	20,00% <td>z <td>18 495,26</td> </td>	z <td>18 495,26</td>	18 495,26

0,00
 3 699,05

Cena s DPH	v	EUR
22 194,31		

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	Zhotoviteľ Dátum a podpis: Pečiatka

CS, s.r.o.
 Coburgova 84, 917 02 Trnava
 IČO:44101937, IČ DPH:SK2022576534
 E.U. 24401332356/0200

(14)

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
 03 - Výmena potrubného vedenia odpadového kanála

Dátum:
 23.04.2013

Projektant:
 Spracovateľ:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

Miesto:

Stavba:
 Objekt:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

4 - Vodovodné konštrukcie

5 - Kominikácie

8 - Rurové vedenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 495,26

0,00

451,89

1 519,62

9 968,40


312,00

352,60

5 890,75

18 495,26

18 495,26



ROZPOČET

Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
 Objekt: 03 - Výmena potrubného vedenia odpadového kanála

Dátum: 23.04.2013

Projektant:
 Spracovateľ:

Miesto:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
 18 495,26
 1 - Zemné práce
 5 890,75

6	K	113107211	Odstánenie koryta v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, - 0,16000t	m ²	20,000	0,46	9,20
5	K	113307132	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m ²	20,000	28,89	577,80
4	K	113307141	Odstánenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m ²	20,000	2,59	51,80
1	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	220,000	10,30	2 266,00
2	K	162201101	Vodovodné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	220,000	5,00	1 100,00
14	K	174201101	Zásyp sypatinou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	139,000	1,33	184,87
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypatinou	m ³	23,000	12,66	291,18
16	K	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovline do 1:5	m ²	258,300	0,62	160,15
17	M	0057211200	Trávové semeno - parkový zmes	kg	7,981	4,40	35,12
15	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovline , plocha do 500 m ² ,hr.do 200 mm	m ²	258,300	2,72	702,58
7	K	979091111	Vodovodné premiestnenie vybudovaných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m	t	13,960	30,71	428,71
8	K	979093111	Poplatok za skládku	t	13,960	0,33	4,61
9	K	pol 1	Poplatok za skládku	t	13,960	5,64	78,73

4 - Vodovodné konštrukcie

10	K	451595111	Ližko pod potrubie, stoky a drobné objekty, hr. 20 cm, frakcie 0-63 so zhutnením	m ³	21,500	16,40	352,60
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

5 - Komunikácie

20	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m ²	20,000	1,26	25,20
21	K	578141111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo dreveného s rozprestrením jemnozrnný hr.40 mm	m ²	20,000	14,34	286,80

8 - Rúrové vedenie

11	K	811441111	Montáž potrubia železobetónových v otvorenom výkope v sklone do 20 % DN 600	m	72,000	32,18	2 316,96
12	M	5922266200	Rúra železobetónová TBP601200 DN 600	m	72,720	89,00	6 472,08
3	K	812429011	Demontáž potrubia z betónových rúr od DN 500 do DN 800 mm -0,710 t	m	72,000		

9 968,40

HSV - Práce a dodávky HSV

18 495,26

18 495,26

CS S.T.O.
 Coburgova 84, 917 02 1118
 IČO:44101937, IČ DPH:SK2022574954
 E.M. 2440132356/02m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	K	919411121	Čelo vtokové a výtokové z betónu prostého	ks	2,000	600,77	1 201,54
19	K	944941102	Ochranné zábradlie ocelové	m	4,970	64,00	318,08

99 - Presun hmôt HSV

22	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné v otvorenom výkope	t	129,112	3,50	451,89
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

451,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trnava20130415 - Revitalizácia areálu kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
 Objekt: 04 - Verejné osvetlenie a ozvučenie

Miesto: _____
 Objednávateľ: _____ IČO: _____ IČO DPH: _____
 Zhotoviteľ: _____ IČO: _____ IČO DPH: _____
 Projektant: _____ IČO: _____ IČO DPH: _____
 Spracovateľ: _____ IČO: _____ IČO DPH: _____
 Datum: 23.04.2013

Náklady z rozpočtu	17 173,98
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	17 173,98
DPH základná	20,00%
z	0,00
znižená	20,00%
z	17 173,98
Cena s DPH	20 608,78

Projektant	Datum a podpis: _____ Pečiatka
Objednávateľ	Datum a podpis: _____ Pečiatka
Spracovateľ	Datum a podpis: _____ Pečiatka
Zhotoviteľ	Datum a podpis: _____ Pečiatka

CS, s.r.o.
 Coburgova 84, 917 02 Trnava
 IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578534
 G.U. 2440102538/0200

Pečiatka

Datum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
 04 - Verejné osvetlenie a ozvučenie

Dátum: 23.04.2013

Projektant:
 Spracovateľ:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Stavba:
 Objekt:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	17 173,98
M - Práce a dodávky M	17 173,98
21-M - Elektromontáže	17 173,98
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 173,98

ROZPOČET

Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter

04 - Verejné osvetlenie a ozvučenie

Dátum: 23.04.2013

Projektant:

Spracovateľ:

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 173,98

M - Práce a dodávky M

17 173,98

Z1-M - Elektromontáže

17 173,98

1	K	210290731	Demontáž stožiar a výšky 6m včetně svetidla a zariadení, likvidácia	ks	12,000	30,00	360,00
2	K	213290150	Demontáž rozvádzača RVO	ks	1,000	50,00	50,00
3	K	213290151	Ostatné drobné demontážne práce	x	1,000	30,00	30,00
1	K	213250201	Montáž základov pre oceľový stožiar V.O. do 6m	ks	7,000	70,00	490,00
2	K	210914201	Montáž elektrovyzbroje stožiar a včetně kábľa v stožiar	ks	7,000	9,50	66,50
3	K	210040011	Montáž 6m stožiar	ks	7,000	15,60	109,20
4	K	213290150.1	Montáž rozvádzača RVO	ks	1,000	65,00	65,00
5	K	213290150.2	Prezbrojenie skrine PRIS	ks	1,000	70,00	70,00
6	K	213290150.3	Ostatné drobné montážne práce	x	1,000	50,00	50,00
1	M	56358741	Stožiar STK/60/60/3 - 6m vysoký	ks	7,000	258,75	1 811,25
2	M	1745689	Elektrovyzbroj stožiar	ks	7,000	27,62	193,34
3	M	56123987	Vodič FeZn 30/4mm	m	350,000	2,20	770,00
4	M	56215153	Kábel CYR-J 4 x 10mm2	m	350,000	5,08	1 778,00
5	M	220111761	Svorok uzemňovacia SP	ks	7,000	3,11	21,77
6	M	109076	Plastová chránička KOPOFLEX d=60mm	m	15,000	1,55	23,25
7	M	213290150	Rozvádzač RVO podľa výkresu E-2	ks	1,000	883,00	883,00
8	M	213290150.1	Prezbrojenie skrine PRIS podľa výkresu E-3	x	1,000	804,00	804,00
9	M	213290150.2	Drobný montážny materiál	x	1,000	100,00	100,00
1	K	210203501	Montáž svetidla na 6m stožiar	ks	7,000	12,50	87,50
1	M	3470402700,00000	Svetidlo Siteco SL 10 Micro	ks	4,000	402,40	1 609,60
2	M	3470402702,00000	Svetidlo Siteco SL 10 Mini	ks	3,000	690,69	2 072,07
1	K	460101045	Výkop rhyh 350x900mm	m	300,000	9,60	2 880,00
2	K	460201031	Výkop pátiel pod stožiare d=0,5m; h=1m	ks	7,000	26,00	182,00
3	K	460101015	Úprava terénu	m2	150,000	5,00	750,00
4	K	460101023	Zásyp rhyh pieskové lôžko 10cm	m3	5,000	19,50	97,50
5	K	460101023.1	Dosypenie 30cm piesku	m3	17,000	19,50	331,50
6	K	460101036	Zásyp štrkom frakcie 0-32 (cca 10cm)	m3	5,000	19,50	97,50
7	K	460101087	5 cm liaty asfalt s posypom	m3	2,600	50,00	130,00
8	K	460102004	Rezanie asfaltu, vybudranie, naloženie a odvoz na skládku	m3	3,400	15,00	51,00
9	K	460101087.1	Odvoz a uskladnenie prebytočnej sule a výkopu	t	6,000	20,00	120,00
10	K	460101044	Ručný výkop rhyh 350x900mm	m	30,000	8,00	240,00
11	K	213290150.4	Vytýčenie sietí	x	1,000	150,00	150,00
12	K	213290150.5	Projekt skutočného vyhotovenia	x	1,000	250,00	250,00
13	K	213290150.6	Geodetické zameranie	x	1,000	150,00	150,00
1	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod.	15,000	20,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenňný mlyn, II. etapa - amfiteáter

05 - Mobilár

Dátum: 23.04.2013

Trnava

Objednávatel':

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ':

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ':

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

30 945,92

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

30 945,92

DPH základná

0,00

20,00%

z

0,00

znižená

20,00%

z

30 945,92

6 189,18

Cena s DPH

V EUR

37 135,10

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ'

Dátum a podpis:

Pečiatka

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022576534
e.u. 24401932366/0200

Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter

Objekt:

Zhotovitel:

Trnava

23.04.2013

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]


30 945,92

30 945,92

30 945,92

00'0

30 945,92



ROZPOČET

Trnava20130415 - Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa - amfiteáter
05 - Mobiliár

Miesto: Trnava Dátum: 23.04.2013

Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 945,92
N00 - Nepomennované práce
30 945,92
N01 - Nepomennovaný diel
30 945,92

1	K	pol1	Demontáž jestvujúcich stolov a lavíc	kom	1,000	250,00	250,00
2	K	pol2	Odvoz stolov a lavíc na skládku	kom	1,000	45,00	45,00
3	K	pol3	Montáž lavíc + kotviaci a tesniaci materiál	m	390,000	11,20	4 368,00
4	M	5624900050	Lavica z troch dosiek 120x37 mm v celkovej šírke 440 mm	m	390,000	63,50	24 765,00
5	K	pol4	Dodávka a montáž stojanov na bicykle	ks	8,000	141,00	1 128,00
6	K	pol5	Premiestnenie smetných košov a ich osadenie do betónových základov	ks	8,000	48,74	389,92

Zoznam poddodávateľov

Objekt	Poddávateľ	Objem poddávok (%)
1	SO 04 Rekonštrukcia verejného osvetlenia a ozvučenia Marek Šebek – Marell, Trnava	12
2	SO 02 Úprava stupňov amfiteátra – kamenný koberec PRESSBETON SK, s.r.o., Bučany	6
3	SO 05 Mobilár – sedenie do prírodného kina EKOPLASTIKA SLOVAKIA spol. s r.o., Slovenská Nová Ves	19
4	SO 01 Komunikácie spevnené plochy – Sadové úpravy Regia, v.z., Trnava	1
	Spolu objem prác poddávateľov (%)	38
	Objem prác uchádzača (%)	62

V Trnave, dňa 23.4.2013

Ing. Miroslav Marcian
konateľ

podpis


CS, s.r.o.
 Coburgova 84, 917 02 Trnava
 IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
 G.U. 24401323556/0200


CS, s.r.o.
 Coburgova 84, 917 02 Trnava
 IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
 G.U. 24401323556/0200



ISO 9001
DIN EN ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certified by

CS, s.r.o. Coburgova 84, 917 02 Trnava
Tel: 033 / 29 33 290 Fax: 033 / 29 33 291
Email: cs@cs.sk





ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

CS, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava týmto vyhlasuje, že

berie na vedomie a súhlasí s požiadavkami obstarávateľa uvedené v časti B1 súťažných podkladoch.

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578534
O.Ú. 24401323556/0200

Ing. Miroslav Marcian
konateľ

podpis

v Trnave, dňa 23.4.2013

Obchodný register Okres

M: SK2022578534

O.Ú. 2440132

CS, s.r.o.
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578534
(14)

Bratislava, 19.4.2013
Naša záruka č. 0091

Mesto Trnava
Trhová 3
917 71 Trnava
IČO: 00 313 114

Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť CS, s.r.o., IČO: 44 101 937, so sídlom Coburgova 84, 917 02 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 21753/T (ďalej ako Uchádzač) Vám predložil ako obstarávateľovi svoju ponuku (ďalej ako Ponuka) na predmet obstarávania, ktorým je: „Revitalizácia areálu Kamenný mlyn, II. etapa – armítateľ“ a to v súvislosti s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 67/2013 zo dňa 5.4.2013 pod číslom 5237-WYP, pričom v tejto súvislosti je požadované vystavenie ponukovej bankovej záruky.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Uchádzača Vám týmto my, _____, zriadená na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Ss a splnenie tejto podmienky zo strany Uchádzača, dávame svoju neodvolateľnú bankovú záruku až do výšky

4 000,00 EUR

slovom: štyritisíc 00/100 EURO

a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám akúkoľvek sumu alebo sumy až do celkovej výšky nami zarúčenej sumy a to do 5 dní po doručení Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie na Váš účet v nej uvedeny. Vo svojej výzve uvediete, že Uchádzač porušil podmienky verejnej súťaže, pretože odstúpil od svojej Ponuky počas plynutia lehoty viazanosti ponúk.

Pre účely identifikácie bud'

(i) Vaša písomná výzva na zaplatenie nám musí byť predložená prostredníctvom Vašej banky, ktorá potvrdí, že podpisy uvedené na Vašej písomnej výzve sú právne záväzné za Vás; alebo

(iii) podpisy oprávnených osôb na Vašej písomnej výzve musia byť úradne overené.

Náš záväzok z tejto záruky bude automaticky redukovaný o každú platbu vykonanú nami za účelom plnenia z tejto bankovej záruky.

Táto záruka je účinná dňom vystavenia a je platná do 31. júla 2013. Po tomto termíne platnosť tejto záruky zanikne automaticky a v plnej výške bez ohľadu na to, či nám bude vrátený originál záručnej listiny alebo nie. Vaša výzva na plnenie z tejto bankovej záruky nám musí byť doručená najneskôr do vyššie uvedeného termínu.

Trn 6506.3 – Správa bankových záruk a

dokumentárných obchodov

829 90 Bratislava 2
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: S



V prípade, že najneskôr do hore uvedeného termínu platnosti bankovej záruky bude od Uchádzača na adresu banky: [] , doručené písomné oznámenie s uistenkou o predĺžení lehoty viazanosti ponúk vo verejnej súťaži, platnosť tejto bankovej záruky sa automaticky predĺži až do posledného dňa viazanosti ponuky uvedeného v Uchádzačom písomnom oznámení, maximálne však do 18. apríla 2014.

Platnosť tejto bankovej záruky môže skončiť skôr, ako je posledný deň jej platnosti určený vyššie, a to

- (i) dňom nášho obdržania originálu tejto záručnej listiny; alebo
- (ii) dňom vyplatenia celej záručnej sumy oprávnenému z tejto bankovej záruky; alebo
- (iii) dňom obdržania Vášho písomného prehlásenia, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom uvediete, že túto záruku považujete za ukončenú a vzdávate sa akéhokoľvek nároku na plnenie z nej; alebo
- (iv) dňom obdržania kópie rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení Verejnej súťaže, prípadne zverejnením takejto rozhodnutia vo Vestníku verejného obstarávania, prípadne obdržaním kópie Vášho oznámenia Uchádzačovi o zrušení Verejnej súťaže.

Táto záruka sa spravuje podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky.

Práva z tejto záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu a táto záruka platí len pre Vás. Táto záruka podlieha jednotným pravidlám pre záruky vyplátené na požiadanie, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 458.

Naša záruka č. 009020121833

Ing. Tomáš Frič
vedúci tímu odboru Firemná klientela


Ing. Daniela Múčková
expert bankových záruk

Tím 6506.3 – Správa bankových záruk a dokumentárnych obchodov


E-mail: bai

COBURG
917 02 Třnava
534

Náčrtok s popisom kotvenia lavíc do podkladnej vrstvy

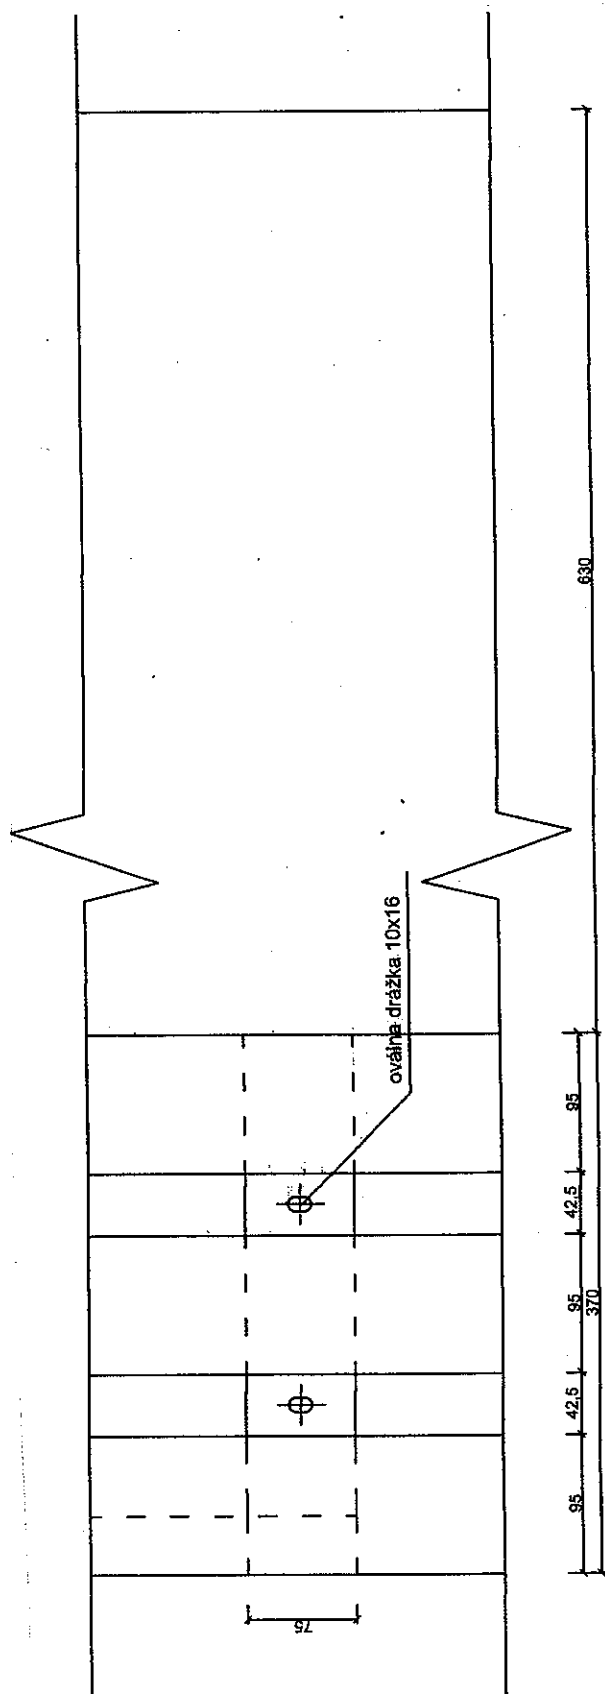

pôdorys

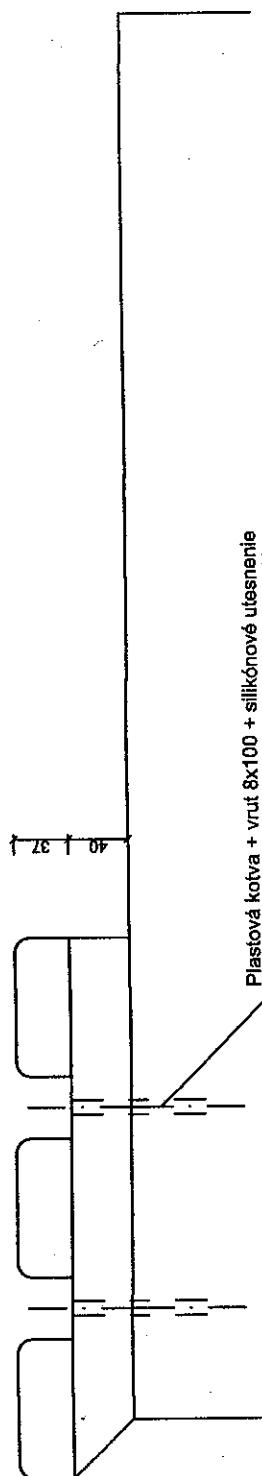

rez

